

FACTURA

Serie ITS Numar 4200

Data 29.07.2022 Scadent la 28.08.2022

- RON - Curs referinta 4.9353



Furnizor	Client
S.C.INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
CIF RO38189005 RC J40/15452/2017	CIF RO37714360
Capital soc. 10 000 000 RON	MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, BLD BASARABIA
BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242	NR.256, CORP C1
Banca GARANTIBANK AGENTIA UNIRII	
IBAN RO54 UGBI 0000 0220 3264 5RON	
Banca Trezoreria Sector 3	
IBAN RO85 TREZ 7035 069X XX01 9401	

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	DECONTARE 1 CF CTR 1023/09.03.2022 PARKING HALA LAMINOR	BUC	1.000	136 743.1000	136 743.10	25 981.19

Termen de plata: 30 ZILE

Date privind expeditia 136 743.10 25 981.19

Numele delegatului: POSTA

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Total **162 724.29**

Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29



INTERNET
& TEHNOLOGIE
Sector 3

INTERNET & TEHNOLOGIE S3
CUI RO38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017
Tel.0310699145, Web: office@its3.ro, www.its3.ro
Calea Vitan, nr. 242, birou 1,2, 6, Sect. 3, București

BENEFICIAR: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
EXECUTANT: SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL
OBIECTUL: SYSTEM PARKING HALA
ETAPA/ FAZA LUCRARE: I

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT

Nr. 1 Data 06.05.2022

Se preda amplasamentul lucrării: SYSTEM PARCARE - HALA LAMINOR
situat în BUCUREȘTI - SECT. 3, pe baza contractului/ proiectului tehnic nr. 1023/09.03.2022

Elementul de reper și verificare este (borna, construcția învecinată etc.) proiectul tehnic de specialitate nr., respectiv proiectul tehnic de arhitectura nr.

Borna de reper: nr. cota SUBIOL HALA
având coordonatele: X:
Y:
Z:


Observatii: Se poate trece la etapa urmatoare, TRASAREA LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, 06.05.2022 în 2 exemplare originale.

BENEFICIAR,
Drașes Brăeșim

EXECUTANT,
SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

ȘEF DE ȘANTIER
MUSTAȚĂ ADRIAN

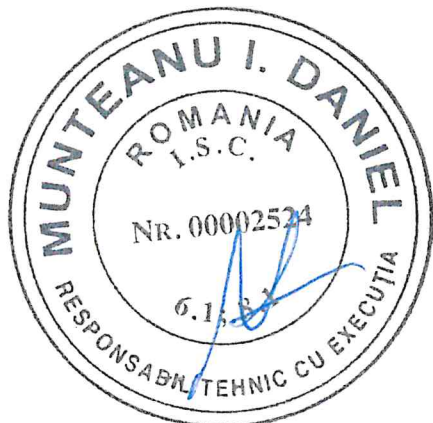



INTERNET
& TEHNOLOGIE
Sector 3

INTERNET & TEHNOLOGIE S3
CUI RO38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017
Tel.0310699145, Web: office@its3.ro, www.its3.ro
Calea Vitan, nr. 242, birou 1,2, 6, Sect. 3, București

BENEFICIAR: ALGORITHM CONSTRUCTII
EXECUTANT: SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
OBIECTUL: ANTEM PARKING HALA
ETAPA/ FAZA LUCRARE: I

PROCES VERBAL DE TRASARE A LUCRĂRILOR

Nr. 1 Data 20.06.2022

Trasarea amplasarii pentru lucrarea: ANTEM PARCARE HALA, a fost executata pe baza planșelor tehnice de specialitate
Elementul de reper și verificare este (borna, construcția învecinată etc.) proiectul tehnic de specialitate nr., respectiv proiectul tehnic de arhitectura nr.
Borna de reper: nr. cota SUBSOL HALA

având coordonatele: X:
Y:
Z:

Observatii: Se poate trece la etapa urmatoare, respectiv: MONTAJ

Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, 20.06.2022 în 2 exemplare originale.

BENEFICIAR,

Dragos Braciu

EXECUTANT,

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

ȘEF DE ȘANTIER

MUSTAȚĂ ADRIAN





BENEFICIAR: ALGORITHM CONSTRUCTII
EXECUTANT: SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
OBIECTUL: SISTEM PARKING HALA
ETAPA/ FAZA LUCRARE: 7

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CANTITATIVA SI CALITATIVA

PRODUSE SOSITE PE SANTIER

Nr. 1 Data 07.06.2022

Cu ocazia verificarii cantitative si calitative efectuate la lucrarile din cadrul contractului/ comenzii nr. 1023/09.03.2022

Prezentul proces verbal este încheiat între ALGORITHM CONSTRUCTII, în calitate de **BENEFICIAR** și SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL, în calitate de **EXECUTANT**.

Receptia s-a desfasurat în intervalul 08⁰⁰ - 12⁰⁰ si au participat ca si Comisie de receptie, urmatoarii:

1. Din partea BENEFICIARULUI:

DRAGOȘ CRĂCIUN - Șef Santier

2. Din partea EXECUTANTULUI:

ing. ARIAN MURDĂRĂ - Șef Lucrări

Au stat la baza verificării următoarele elemente¹:

CONTRACT - AVIZ-OPERTA

FURNIZOR PRODUSE: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

DENUMIRE PRODUS: cfm. atasamente

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

- materialele și echipamentele prezintă/ nu prezintă lovituri, fisuri vizibile si sunt conform documentelor tehnice aprobate²
- materialele și echipamentele sunt/ nu sunt certificate, agrementate din punct de vedere al respectării cerințelor de calitate impuse de legislația în vigoare.

OBSERVAȚII :

¹ FAM-uri, proiect tehnic, planse tehnice etc.

² Documentele tehnice aprobate reprezintă cel puțin unul din următoarele: contract, FAM, proiect, documente de calitate, normative și standarde tehnice, etc.



CONCLUZII:

Materialele sunt/ ~~nu sunt~~ conforme normelor si standardelor in vigoare si fiselor tehnice elaborate de proiectant.

S-a constatat ca s-a respectat/ ~~nu s-a respectat~~ tipul de material/ produs, dimensiunile si calitatea cerute prin contract/ proiect. Produsele sunt/ ~~nu sunt~~ insotite de certificate si declaratii de conformitate

Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie, în unanimitate:

- **recomandă încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor din etapa/ faza de lucru** **cu/ fără obiecțiuni**

Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, 07.06.2022 în 2 exemplare originale.

BENEFICIAR,

DRAGOS CRĂCIUN

[Signature]
1.

EXECUTANT,

SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

ȘEF DE ȘANTIER

MUSTAȚĂ ADRIAN

[Signature]





BENEFICIAR: ALGORITHM CONSTRUCTIA
EXECUTANT: SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
OBIECTUL: SISTEM PARKING HALA
ETAPA/ FAZA LUCRARE: I

PROCES VERBAL DE MONTAJ

Nr. 1 Data 25.07.2022

Lucrările supuse prezentei receptii, au fost executate în baza contractului/ comenzii de lucrari nr. 1023/09.03.2022 si reprezinta:

SISTEM PARCARE HALA

Prezentul proces verbal este încheiat între ALGORITHM CONSTRUCTIA, în calitate de **BENEFICIAR** și **SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL**, în calitate de **EXECUTANT**.

Receptia s-a desfasurat în intervalul 20.06.2022 - 25.07.2022, si au participat ca si Comisie de receptie, urmatoarii:

1. Din partea BENEFICIARULUI:

DRAGOS CRĂCIUN - Șef Șantier

2. Din partea EXECUTANTULUI:

Jug ARIAN MUSTĂȚĂ - Șef tehnic

Au stat la baza verificarii urmatoarele elemente:

CONTRACTUL

CONSTATARILE COMISIEI:

1. Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor, se constată că:

S-a constatat ca s-au respectat/ ~~nu s-au respectat~~ detaliile tehnice din planurile de amplasare si sunt insotite de certificatele si declaratiile de conformitate de la furnizor si producator, acestea respecta normele si standardele in vigoare.

2. Au fost/ ~~nu au fost~~ stabilite urmatoarele masuri:

se aduc la receptia lucr. din et. I

3. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: **ADMITEREA/ RESPINGEREA RECEPTIEI**



4. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

LUCRARILE AU FOST/ ~~NU AU FOST~~ EXECUTATE CONFORM NORMELOR SI NORMATIVELOR IN VIGOARE, ANEXEI LA CONTRACT, PROIECTULUI TEHNIC, dupa caz

CONCLUZII:

Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie, în unanimitate:

- **recomandă încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor din etapa/ faza de lucrare**

..... I, ~~cu/~~ fără obiecțiuni

.....
.....
.....

Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, 25.07.2022 în 2 exemplare originale.

BENEFICIAR,
Magos Brăciun
[Signature]

EXECUTANT,
SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

ȘEF DE ȘANTIER
MUSTAȚĂ ADRIAN

[Signature]





BENEFICIAR: ALGORITHM CONSTRUCTII
EXECUTANT: SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
OBIECTUL: SISTEM PARKING HALA
ETAPA/ FAZA LUCRARE: I

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 Data 25.07.2022

Lucrările supuse prezentei receptii, au fost executate în baza contractului/ comenzii de lucrari nr. 1023/09.03.2022

Prezentul proces verbal este încheiat între ALGORITHM CONSTRUCTII, in calitate de **BENEFICIAR** și **SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL**, in calitate de **EXECUTANT**.

Receptia s-a desfasurat în intervalul oraș 12⁰⁰-14⁰⁰, si au participat ca si Comisie de receptie, urmatoarii:

1. Din partea BENEFICIARULUI:

DRAGOS CRAIADUN - sef Saniter

2. Din partea EXECUTANTULUI:

Ing. AORIAN MUSTATA - sef fontier

II. CONSTATARILE COMISIEI:

- Din măsurătorile la fața locului, a rezultatelor și a probelor de PIF, dupa caz, și a verificărilor din teren, se constată că documentația/ lucrarile sunt/ ~~nu sunt~~ complete.
- Cantitățile de lucrări cuprinse în contract/ comanda au fost/ ~~nu au fost~~ executate
- Lucrarile cuprinse in contract respecta/ ~~nu respecta~~ proiectul/ lista de cantitati/ contractul
- Valoarea lucrarilor executate in etapa/ faza supusa receptiei este de 21.707,15€, exclusiv TVA, cfm. situatiei de lucrari agreeate, anexa la prezentul Proces verbal.
- Valoarea finala a contractului este de, exclusiv TVA, cfm. tuturor situatiilor de plata agreeate.
- Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: ~~ADMITEREA/RESPINGEREA~~ **RECEPTIEI**
- Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
LUCRARILE AU FOST/ ~~NU AU FOST~~ EXECUTATE CONFORM NORMELOR SI NORMATIVELOR IN VIGOARE, ANEXEI LA CONTRACT, PROIECTULUI TEHNIC, dupa caz

¹ Acest punct se completeaza numai la receptia finala a lucrarilor si reprezinta suma tuturor receptiilor partiale predate



III. CONCLUZII:

Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie, în unanimitate:

- **recomandă încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cu / fără obiecțiuni**

.....
.....
.....

Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, 25.07.2022 în 2 exemplare originale.

BENEFICIAR

DRAGOS CRĂCIUN

EXECUTANT,

SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

ȘEF DE ȘANTIER

MUSTAȚĂ ADRIAN



Contract de lucrări nr. 1023/09.03.2022/676/10.03.2022, Act. Ad. 1/1083/13.04.2022

Lucrari de instalatii curenți slabi monitorizare locuri de parcare și punere în funcțiune pentru obiectivul Punere în siguranță a construcției Hală Laminor și construirea unei parcări subterane și a circulațiilor aferente în subsolul Halei

Beneficiar : ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Executant: INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

SITUAȚIE DE LUCRĂRI NR. 1

Nr. crt.	Denumire produs	Producator	Cod produs	U.M.	Cantitate	P.U Euro	Valoare Euro
MONITORIZARE LOCURI DE PARCARE							
ECHIPAMENTE SI MATERIALE							
24	Tub Protecție Ø25 mm			m	745	0.61 €	454.45 €
25	Mufă de îmbinare pentru tub protecție Ø25 mm			buc	217	0.25 €	54.25 €
26	Bridă metalică de fixare 25mm			buc	562	0.14 €	78.68 €
27	Diblu Ø6 mm + holșurub 4x35mm			buc	562	0.09 €	50.58 €
28	Cablu NYM-J 4x1,5 mm ² gri, manta din PVC conform DIN VDE 0281-1			m	6500	0.94 €	6,110.00 €
31	Cablu CYYF 3x2,5 mm			m	1249	1.18 €	1,473.82 €
VALOARE, MATERIALE SI ECHIPAMENTE - EURO, FARA TVA							8,221.78 €
PRESTARI SERVICII							
43	Instalare Tub Protecție Ø25 mm			m	745	4.00 €	2,980.00 €
44	Instalare cablu NYM-J			m	6500	2.13 €	13,845.00 €
47	Instalare cablu CYYF 3x2,5 mm			m	1,249.00	2.13 €	2,660.37 €
VALOARE, SERVICII - EURO, FARA TVA							19,485.37 €
VALOARE EURO, EXCLUSIV TVA							27,707.15 €
TVA						19%	5,264.36 €
VALOARE EURO, INCLUSIV TVA							32,971.51 €

BENEFICIAR,
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Dragoș Răciun
[Signature]

EXECUTANT,
INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

Adrian Mustată

[Signature]

